

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和3年2月25日

計画の名称	吉見町における快適な生活環境の実現		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成29年度 (3年間)	交付対象	吉見町
計画の目標	下水道整備を実施し、沼・水路等の水質が改善することにより、快適な生活環境を実現させる。		

計画の成果目標 (定量的指標)	①平成27年度から平成29年度までに下水道整備達成率を65.1% (H27) から70.2% (H29) に増加させる。 ②平成27年度から平成29年度までに雨水幹線の整備率を38.1% (H27) から38.3% (H29) に増加させる。
-----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)							
① 下水道 (汚水) 整備達成率 汚水整備済み面積 (ha) / 事業計画面積 (ha) 270.7ha	65.1%		70.2% 70.2%							
② 雨水幹線整備率 幹線整備済み延長 (m) / 事業計画雨水幹線総延長 10,670m	(H29当初) 38.1%		38.3% 41.9%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	377百万円 377百万円	A	377百万円 377百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期	
事後評価 (中間評価) の実施体制 吉見町下水道事業審議会にて吉見町下水道事業審議会条例第2条の規定により事後評価の審査を実施する。	事後評価 (中間評価) の実施時期 令和3年3月 公表の方法 町ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業													全体事業費 (百万円)	備考			
A1 下水道事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)						
											H27	H28	H29	H30	H31		
A1-1-1	下水道	一般	吉見町	直接	吉見町	汚水	新設	管渠整備 湖畔・日向山団地地区 (未普及解消)	L=2.2km L=2.4km, マンホールポンプ N=1, 舗装本復旧	吉見町						290 290	
A1-1-2	下水道	一般	吉見町	直接	吉見町	汚水	新設	管渠整備 久米田地区 (未普及解消)	L=0.3Km L=0.3Km	吉見町						65 65	
A1-2-1	下水道	一般	吉見町	直接	吉見町	汚水	新設	排水路整備 久保田地区 (浸水対策)	L=0.02Km L=0.02Km	吉見町						22 22	
											合計	377 377					

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名□	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
											合計	0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
											合計	0.0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 湖畔団地地区を供用開始したことにより、周辺地域の生活環境が改善された。 供用前に実施した説明会の効果もあり、徐々に接続率が上がっている。今後周辺地域の水質向上が見込まれる。 雨水排水路の整備により、老朽化していた護岸が整備され安全性が向上した。 									
II 定量的指標の達成状況	指標①（下水道 （污水）整備達成率）	最終目標値	70.2%	目標値と実績値 に差が出た要因	目標は達成されたが、当初計画の指標作成時に整備済み延長の間違いにより指標数値を訂正□ 当初現況値 38.1% → 41.7% 最終目標値 38.3% → 41.9%						
		最終実績値	70.2%								
	指標②（雨水幹 線整備率）	最終目標値	38.3%								
		最終実績値	41.9%								
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）											

3. 特記事項（今後の方針等）

本計画はH27年度～H31年度までの5年間の計画を重点計画へ移行するため、H29年度までとし、引き続き、H30年度～H31年度の2年間を計画的かつ効率的に污水管渠整備を進めていく重点計画に継続する。

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	吉見町における快適な生活環境の実現		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成29年度 (3年間)	交付対象	吉見町

吉見町下水道事業 全体計画図



凡例

	下水道法による事業計画区域 (全体計画区域)
	管渠(新設)
	既設管渠(幹線)
	未整備管渠(幹線)
	整備区域



整備予定箇所の色分け

	新設 (赤)
	増設 (青)
	改築 (緑)

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	吉見町における快適な生活環境の実現		交付対象	吉見町
計画の期間	平成27年度～平成29年度(3年間)			

吉見町下水道事業 管渠整備 湖畔・日向山団地地区(未普及解消) 計画図

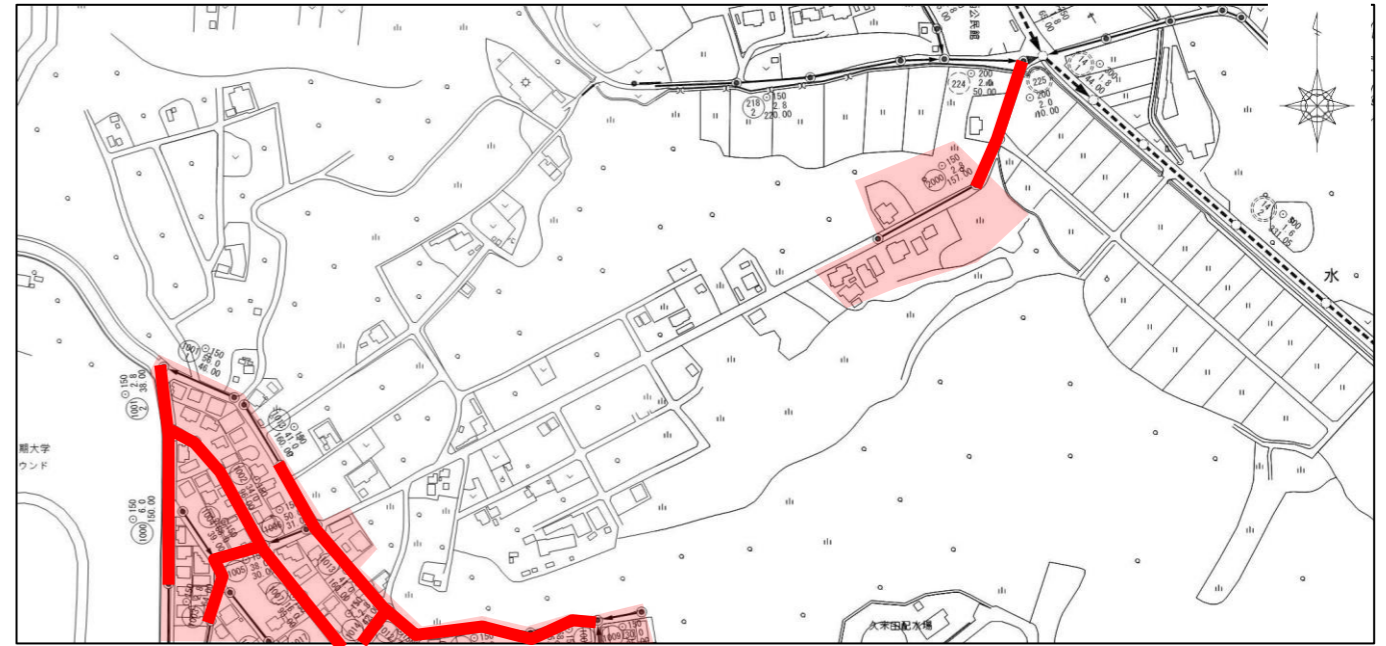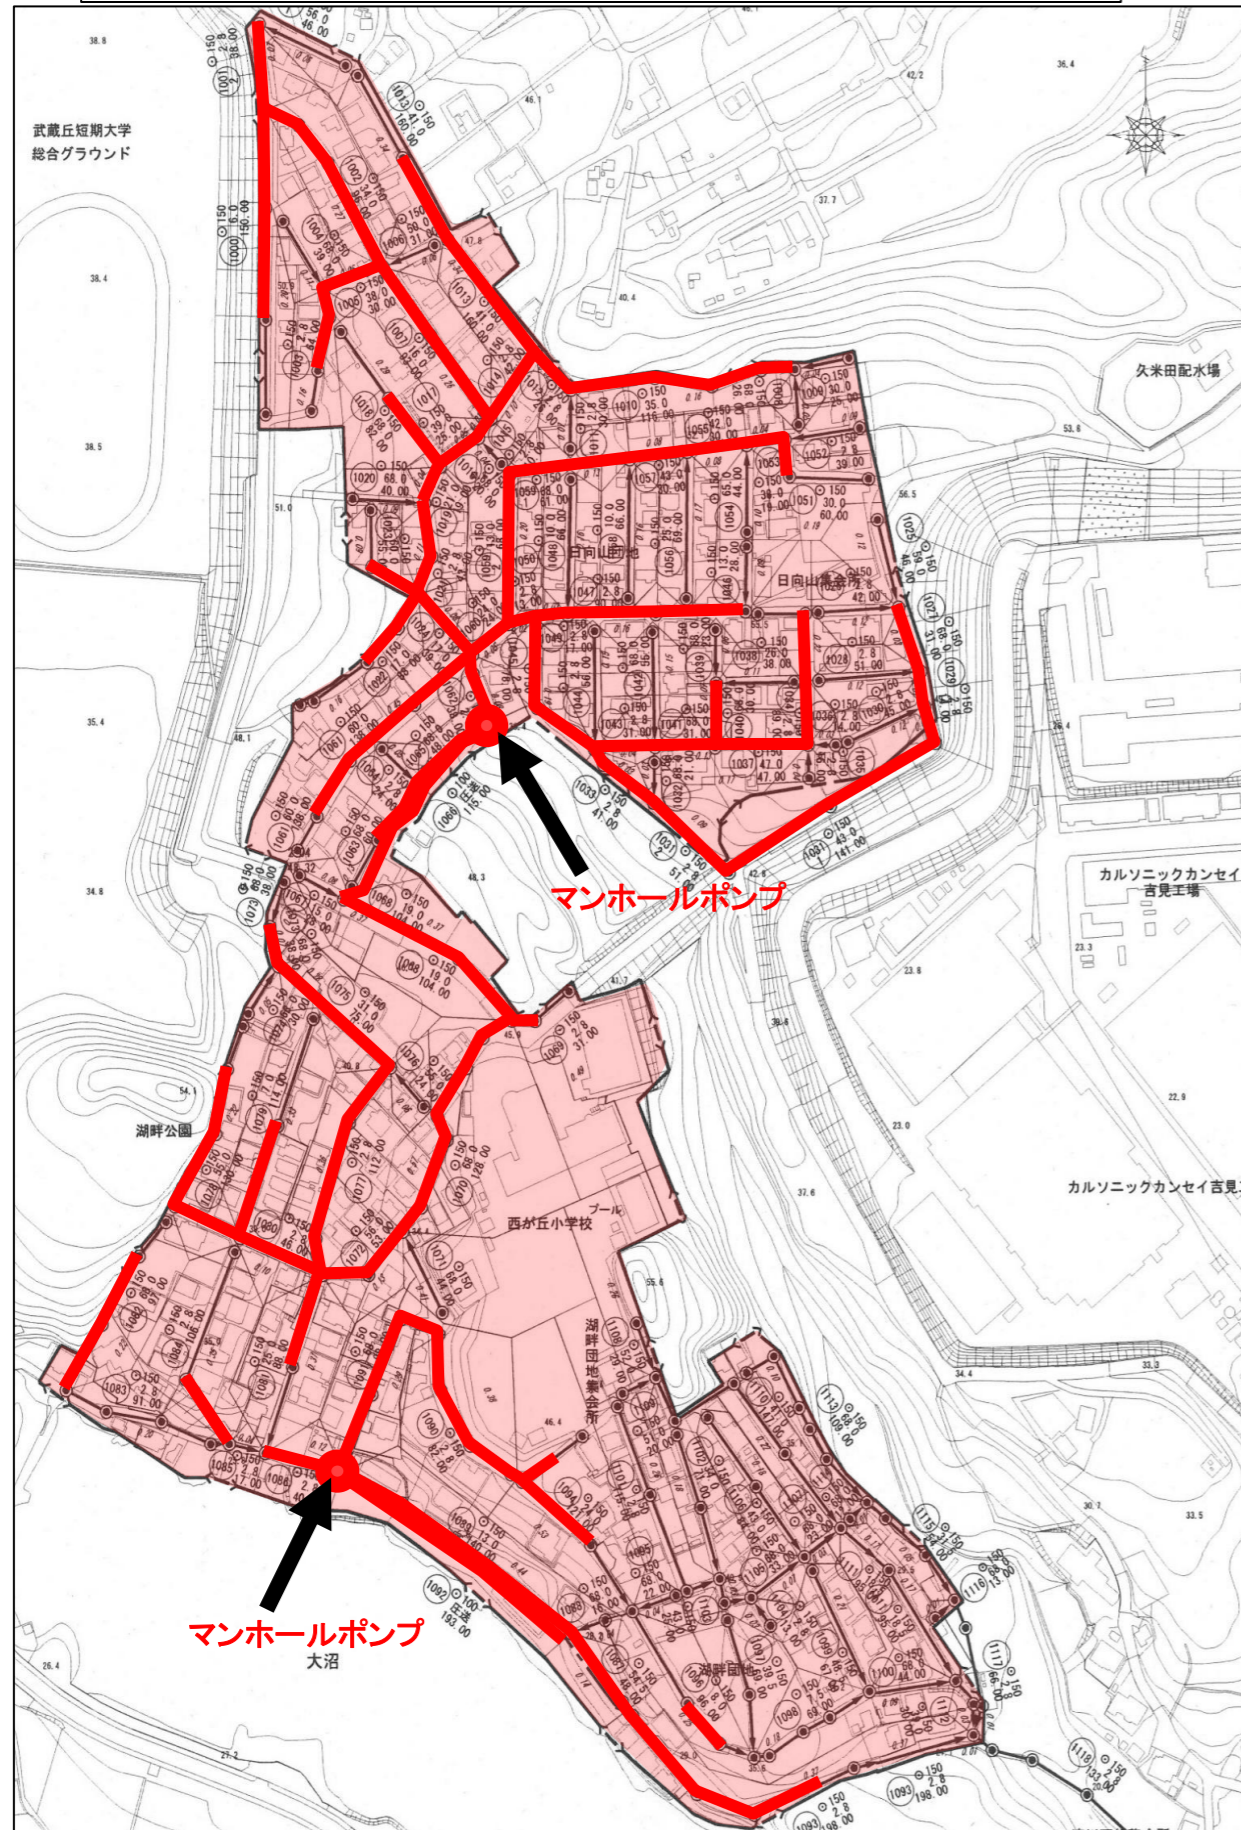


- 整備予定箇所の色分け
- 新設 (赤)
 - 増設 (青)
 - 改築 (緑)
 - 整備区域

- 凡例
- 下水道法による事業計画区域 (全体計画区域)
 - 管渠(基幹事業)A1-1-1

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	吉見町における快適な生活環境の実現		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成29年度 (3年間)	交付対象	吉見町

吉見町下水道事業 管渠整備 久米田地区(未普及解消) 計画図

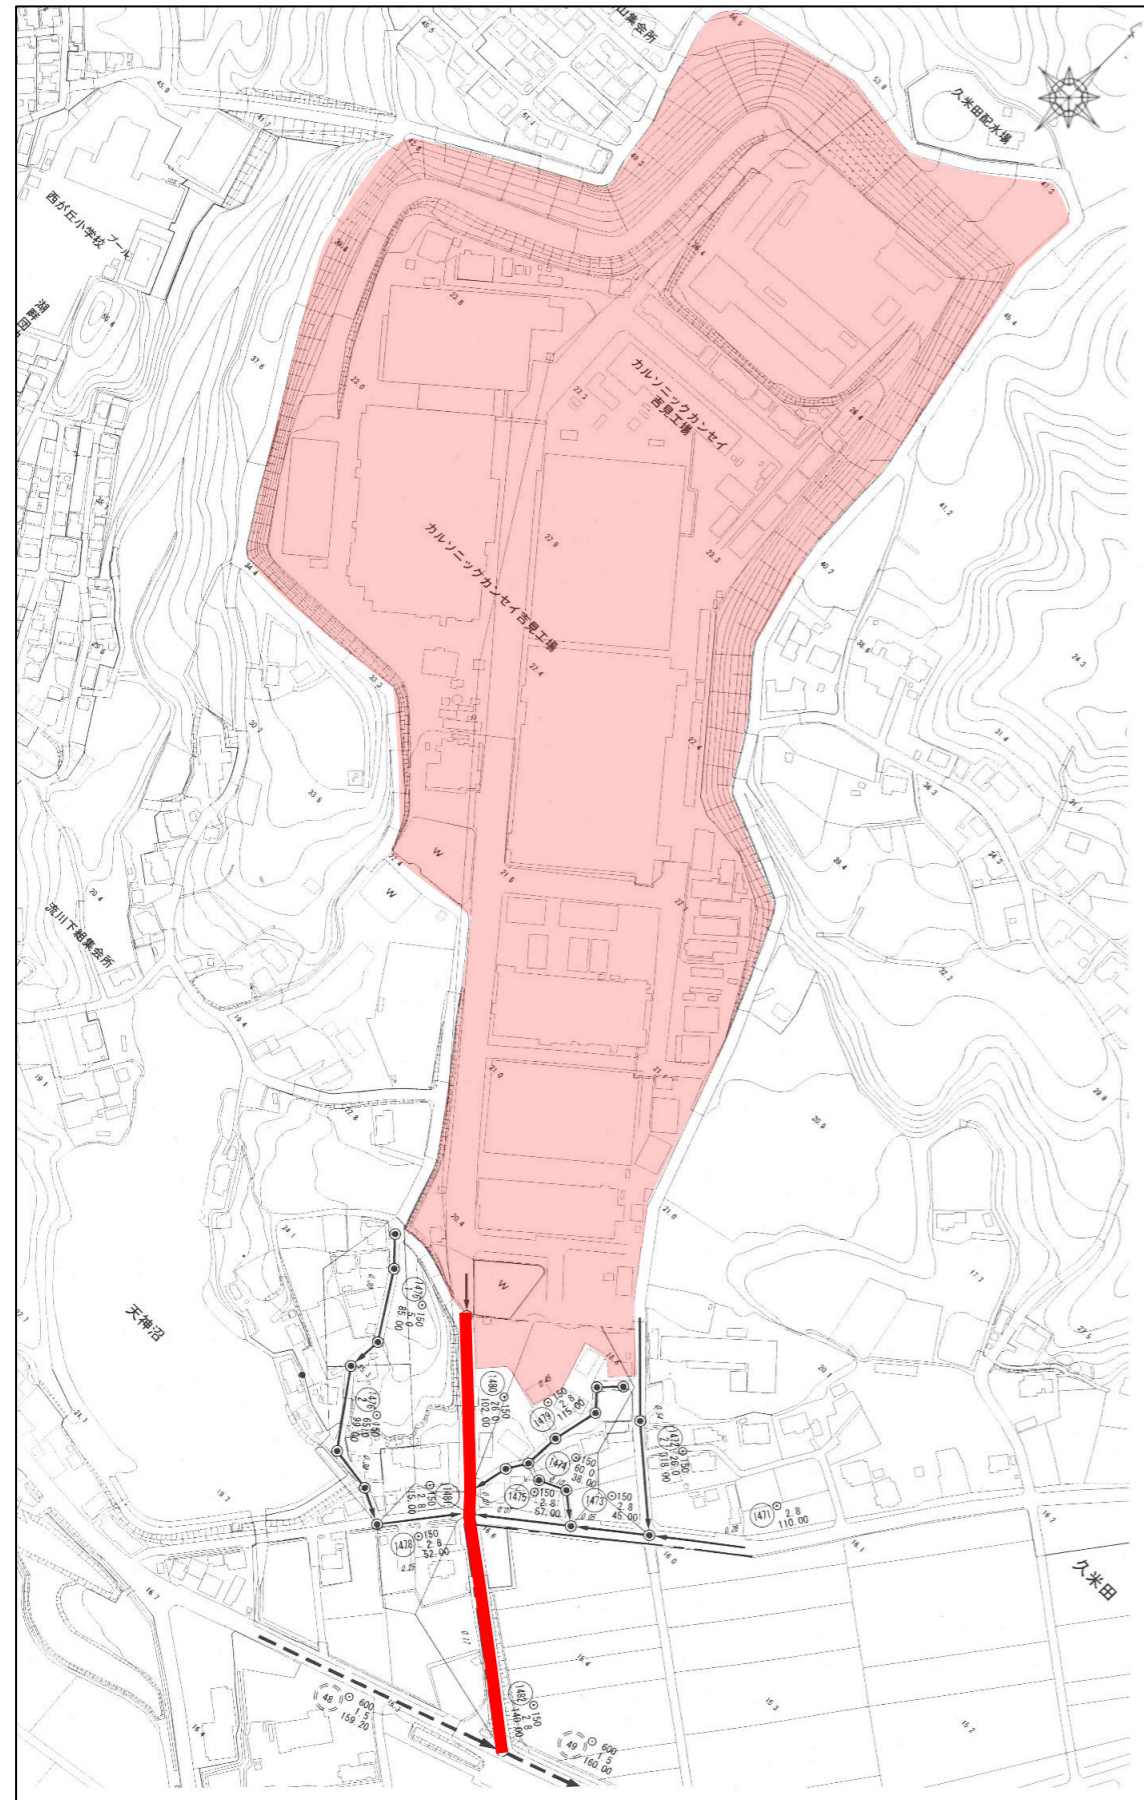

整備予定箇所の色分け

- 新設 (赤)
- 増設 (青)
- 改築 (緑)
- 整備区域

凡例

- 下水道法による事業計画区域 (全体計画区域)
- 管渠(基幹事業)A1-1-2

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	吉見町における快適な生活環境の実現		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成29年度 (3年間)	交付対象	吉見町

吉見町下水道事業 排水路整備 久保田地区(浸水対策) 計画図



整備予定箇所の色分け

- 新設 (赤)
- 増設 (青)
- 改築 (緑)
- 整備区域

凡例

- 下水道法による事業計画区域 (全体計画区域)
- 排水路(基幹事業)A1-2-1
