

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年02月25日

計画の名称	吉見町における快適な生活環境の実現（重点計画）												
計画の期間	平成30年度～平成31年度（2年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	吉見町												
計画の目標	下水道整備を実施し、沼・水路等の水質が改善することにより、快適な生活環境を実現させる。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	121	A	121	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	平成30年度から平成31年度までに下水道整備達成率を70.2%（H30）から79.4%（H31）に増加させる。			
	下水道（汚水）整備達成率	70%	%	79%
	汚水整備済み面積（ha）/事業計画面積（ha） 270.7ha			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
当初一つであった整備計画を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事後評価等を関連する整備計画と一体的に実施する。												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	吉見町	直接	吉見町	管渠(汚水)	新設	管渠整備 湖畔・日向山 団地地区(未普及解消)	管渠整備 L = 1.7 km	吉見町						116	-		
	A07-002	下水道	一般	吉見町	直接	吉見町	管渠(汚水)	新設	管渠整備 久米田地区(未普及解消)	舗装本復旧	吉見町							5	-	
	A07-003	下水道	一般	吉見町	直接	吉見町	管渠(汚水)	新設	管渠整備 中央地区(未普及解消)	詳細設計	吉見町							0	-	
											小計							121		
											合計								121	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
吉見町下水道事業審議会にて、吉見町下水道事業審議会条例第2条の規定により事後評価の審査を実施する。	令和3年3月
	公表の方法
	町ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	本計画は、平成27年度からの引き続き事業で、湖畔団地の供用開始から徐々に接続率も上がり、周辺地域の生活環境が改善され、今後、周辺湖沼等の水質向上が見込まれる。 達成目標であった日向山団地の整備完了についても、令和2年度中に完了し、供用開始を行っており、今後、引き続き周辺地域の生活環境の改善が見込まれる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き、計画的かつ効率的に污水管渠整備を進めていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道（汚水）整備達成率	
	最終目標値	79%
	最終実績値	77%
		当初予定していた区域（日向山）について、開削から推進への変更などより整備が遅れたため、最終目標値を下回る結果となったが、令和2年度には整備が完了し、現在供用開始済みである。

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	吉見町における快適な生活環境の実現(重点計画)		
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2年間)	交付対象	吉見町

吉見町下水道事業 全体計画図



凡例

	下水道法による事業計画区域 (全体計画区域)
	管渠(新設)
	既設管渠(幹線)
	未整備管渠(幹線)
	整備区域



整備予定箇所の色分け

	新設 (赤)
	増設 (青)
	改築 (緑)

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	吉見町における快適な生活環境の実現 (重点計画)		交付対象	吉見町
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2年間)			

吉見町下水道事業 管渠整備 湖畔・日向山団地地区(未普及解消) 計画図

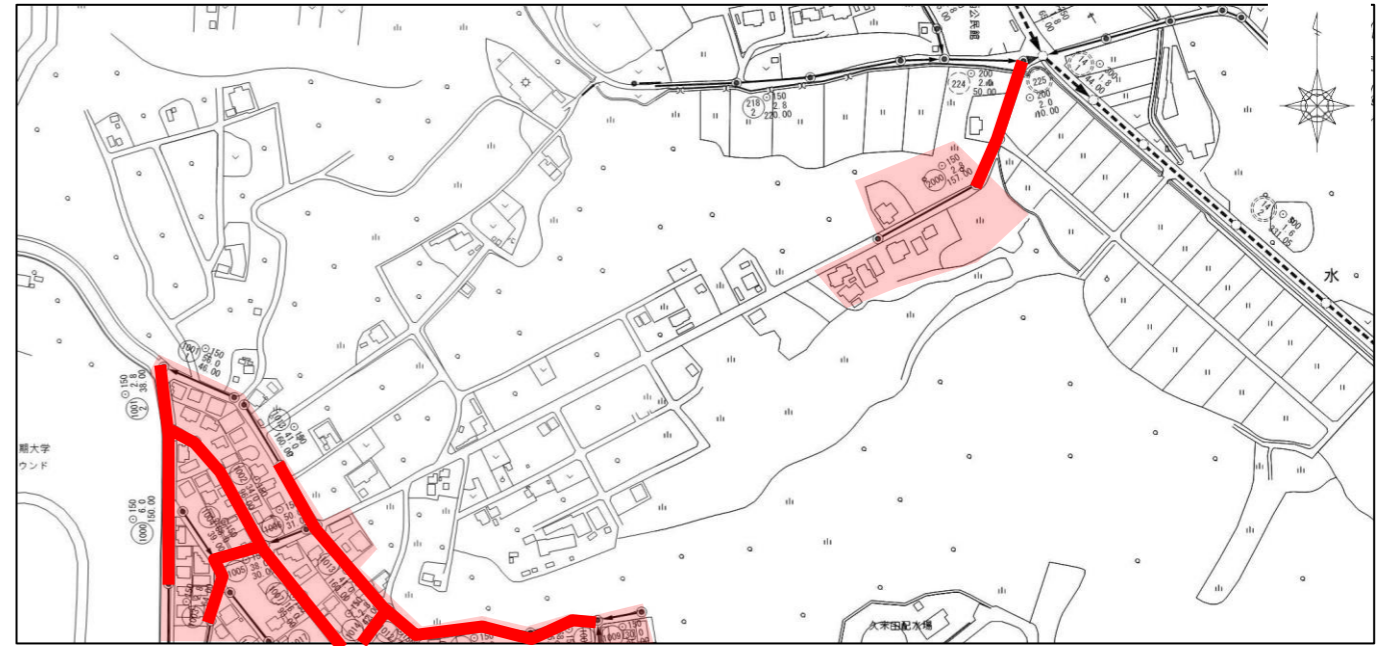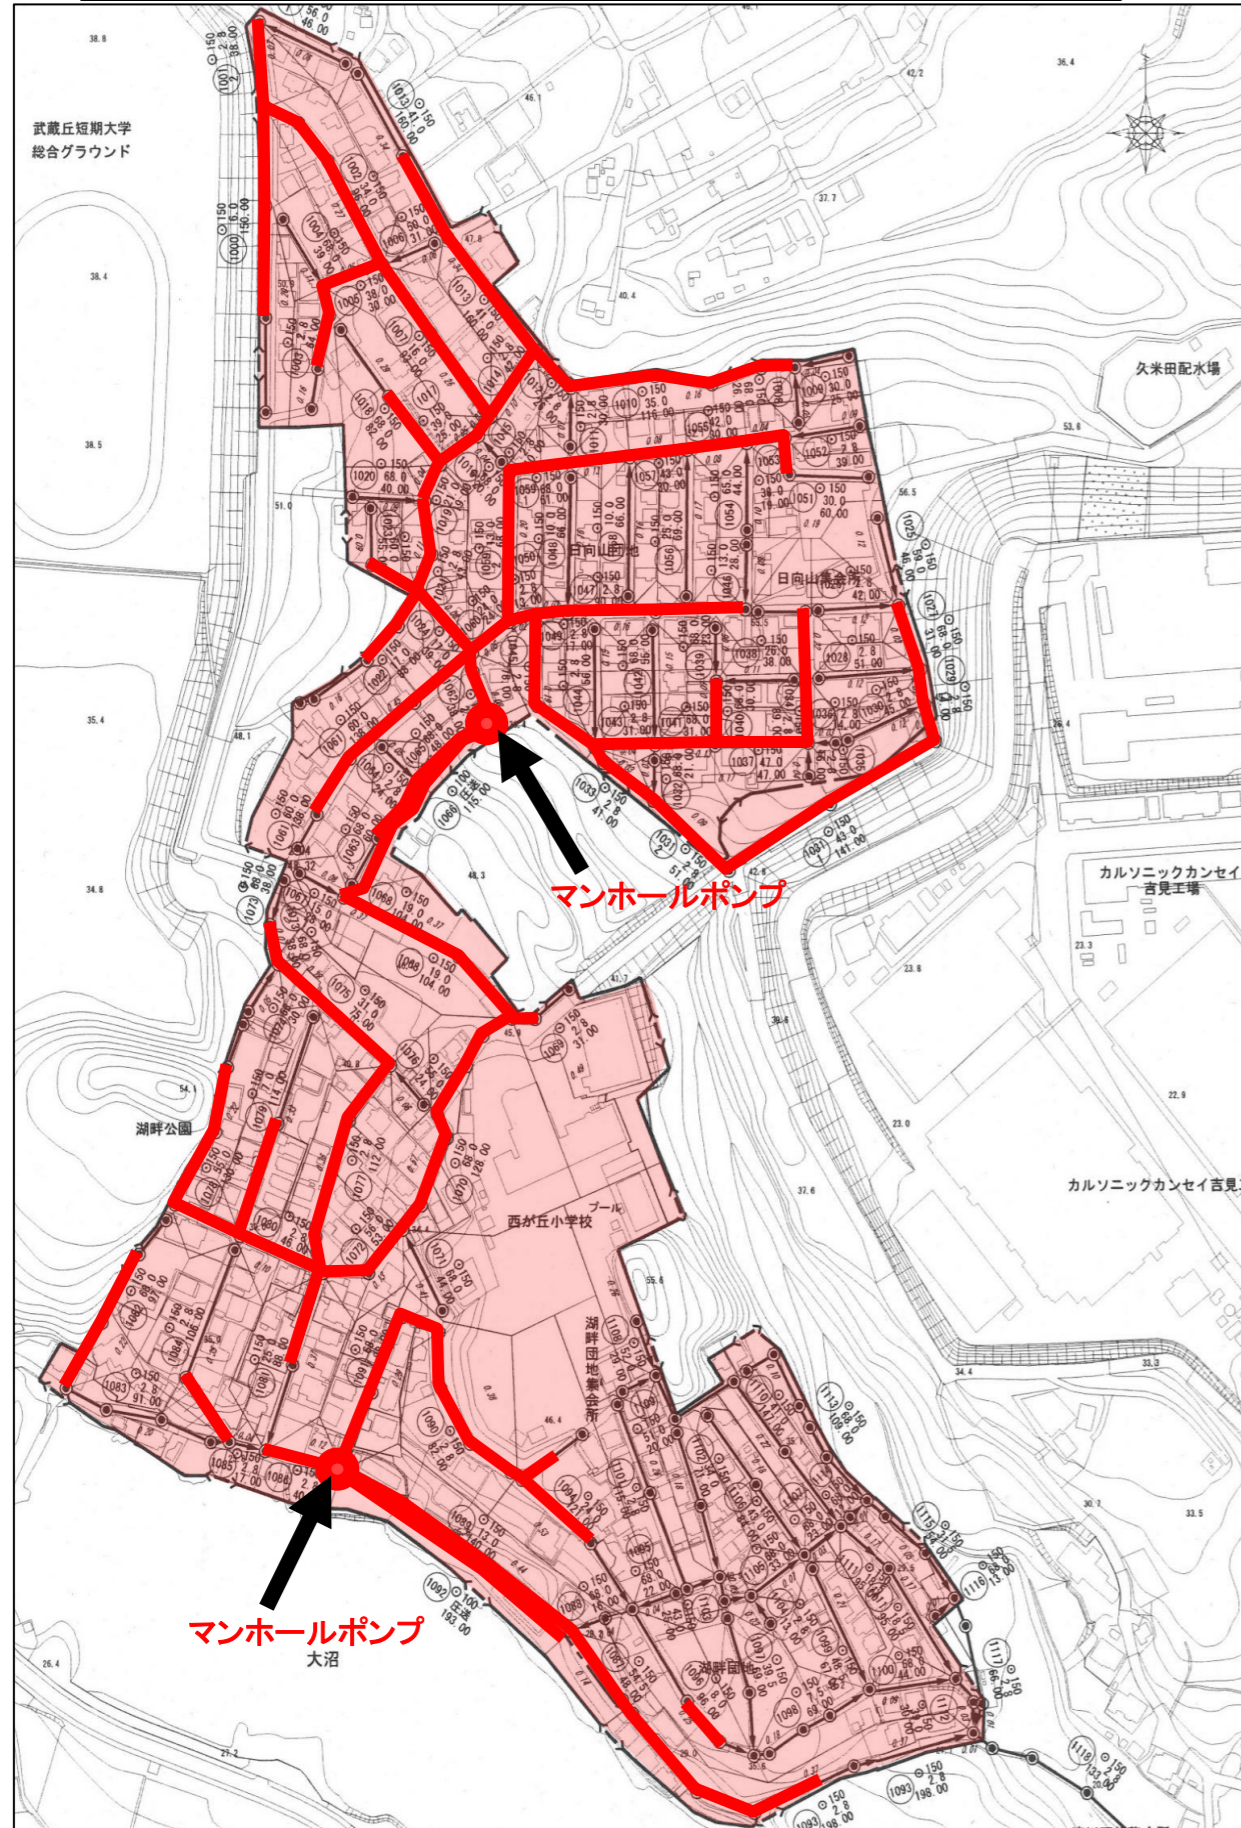


- 整備予定箇所の色分け
- 新設 (赤)
 - 増設 (青)
 - 改築 (緑)
 - 整備区域

- 凡例
- 下水道法による事業計画区域 (全体計画区域)
 - 管渠(基幹事業)A07-001

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	吉見町における快適な生活環境の実現 (重点計画)		
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2年間)	交付対象	吉見町

吉見町下水道事業 管渠整備 久米田地区(未普及解消) 計画図

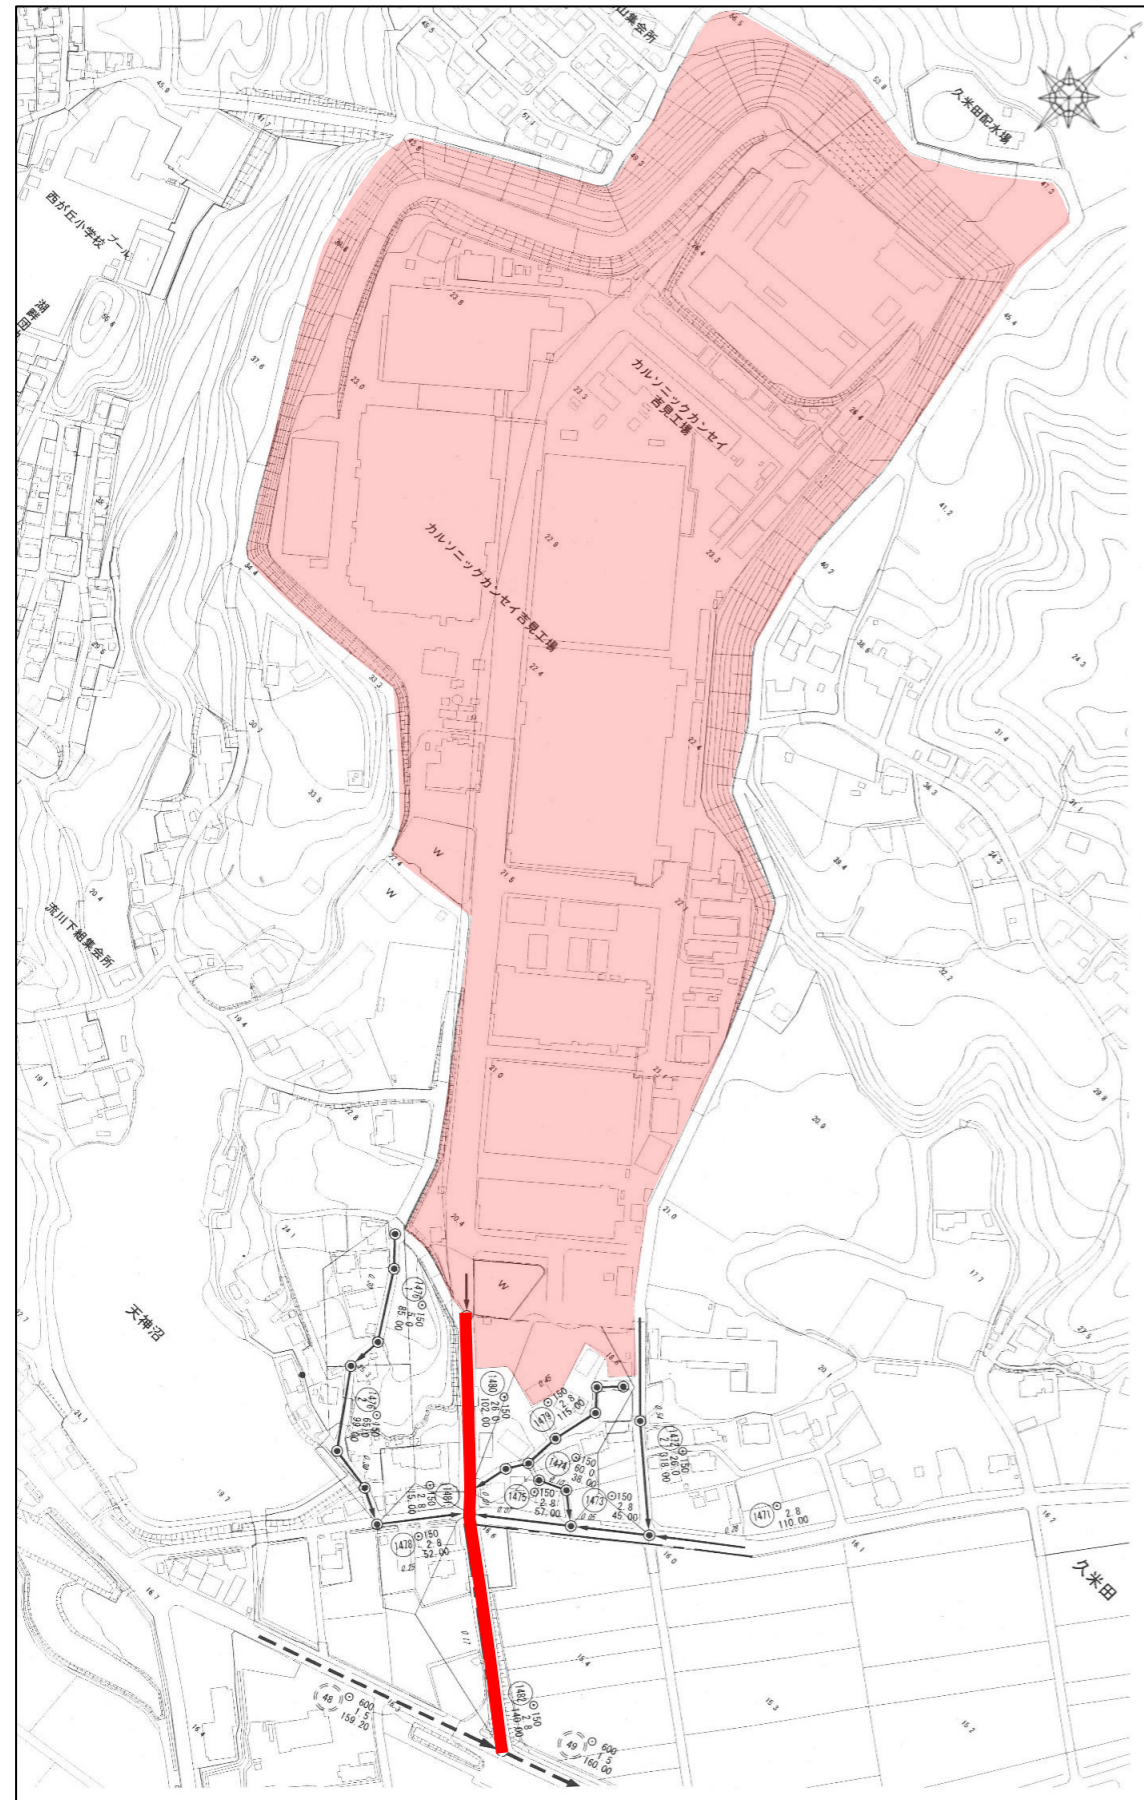

整備予定箇所の色分け

- 新設 (赤)
- 増設 (青)
- 改築 (緑)
- 整備区域

凡例

- 下水道法による事業計画区域 (全体計画区域)
- 管渠(基幹事業)A07-002

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	吉見町における快適な生活環境の実現 (重点計画)		
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2年間)	交付対象	吉見町

吉見町下水道事業 管渠整備 中央地区(未普及解消) 計画図

